


Informacija za medije

Občina Zreče je pristopila k projektu rekonstrukcije javne poti 985431 Stranice – center. V sklop ureditve JP spada ureditev vozne površine ceste, postavitve javne razsvetljave, ureditev odvajanja meteornih voda, izgradnja novega vodovoda ter novega kabelsko komunikacijskega sistema in delna prestavitve ter zaščita obstoječih podzemnih komunalnih vodov.

Projekt obravnava ureditev oz. rekonstrukcijo ceste JP 985431 Stranice – center v skupni dolžini 360,0 m. Meja obdelave obravnavane ceste je od priključitve na regionalno cesto RC II. reda - odsek 0281 in do Gasilskega doma Stranice.

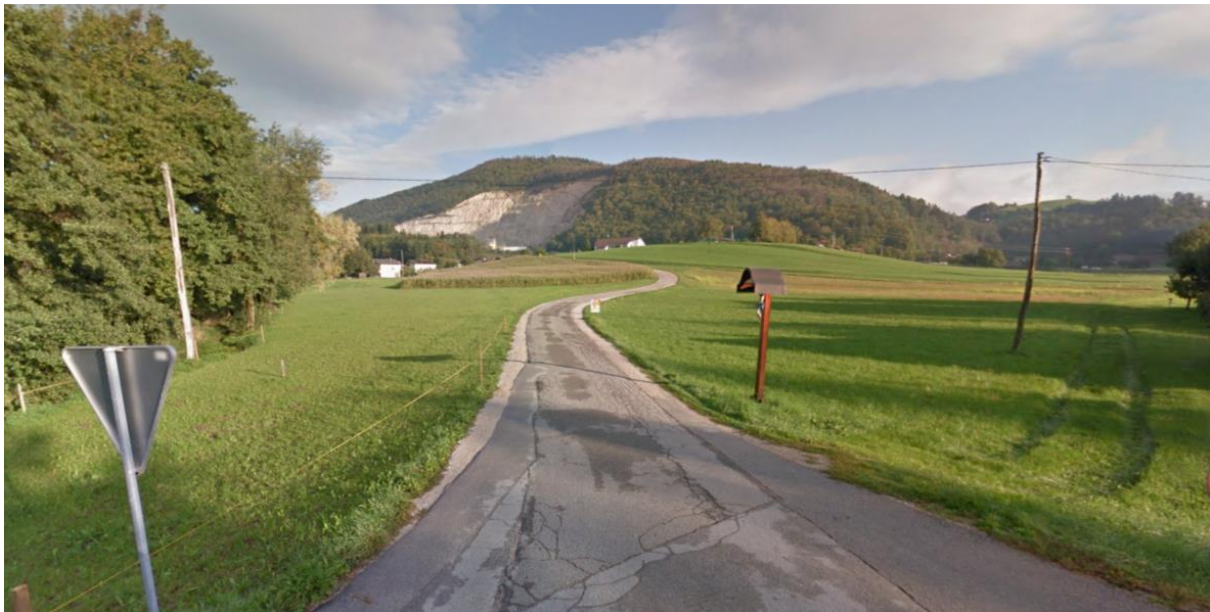

Slika - območje ureditve JP (P1 – P8_priključitev na RC)

Projektno dokumentacijo PZI, št. projekta: 22/17; april 2017 je izdelalo projektantsko podjetje GINS d.o.o., Vojnik.


Obstoječa cesta je asfaltne izvedbe in široka cca 3,0 m. Predvidi se razširitev ceste na širino 5,0 m in pločnik 1,20 m. Cesto se po izvedenem izkopu in ureditvi temeljnih tal utrdi s kamnitim nasipom po potrebi in kamnito posteljico v debelini 40 cm (drobljenec 0-125 mm) ter nadalje z vgradnjo 20 cm tamponskega sloja (drobljenec 0-32 mm).

Uredi se odvodnjavanje z vtočnimi jaški in kanalizacijskimi cevmi (PVC in armirano-betonskimi cevmi). Izvedejo se vtočni jaški premera 50 cm.

Na novi trasi ceste se po ureditvi nevezanih nosilnih plasti vozišča izvede vgradnja asfalta 6 cm + 3 cm. Po izvedbi asfaltnih plasti se uredijo bankine in berme z nasipom tamponskega drobljenca ter brežine s humiziranjem in zatravitvijo.

Tehnični elementi - normalni profil konstrukcije

- vozišče; vozni pas $2 \times 2,50 = 5,0$ m
- pločnik za pešce; hodnik $1 \times 1,20$ m

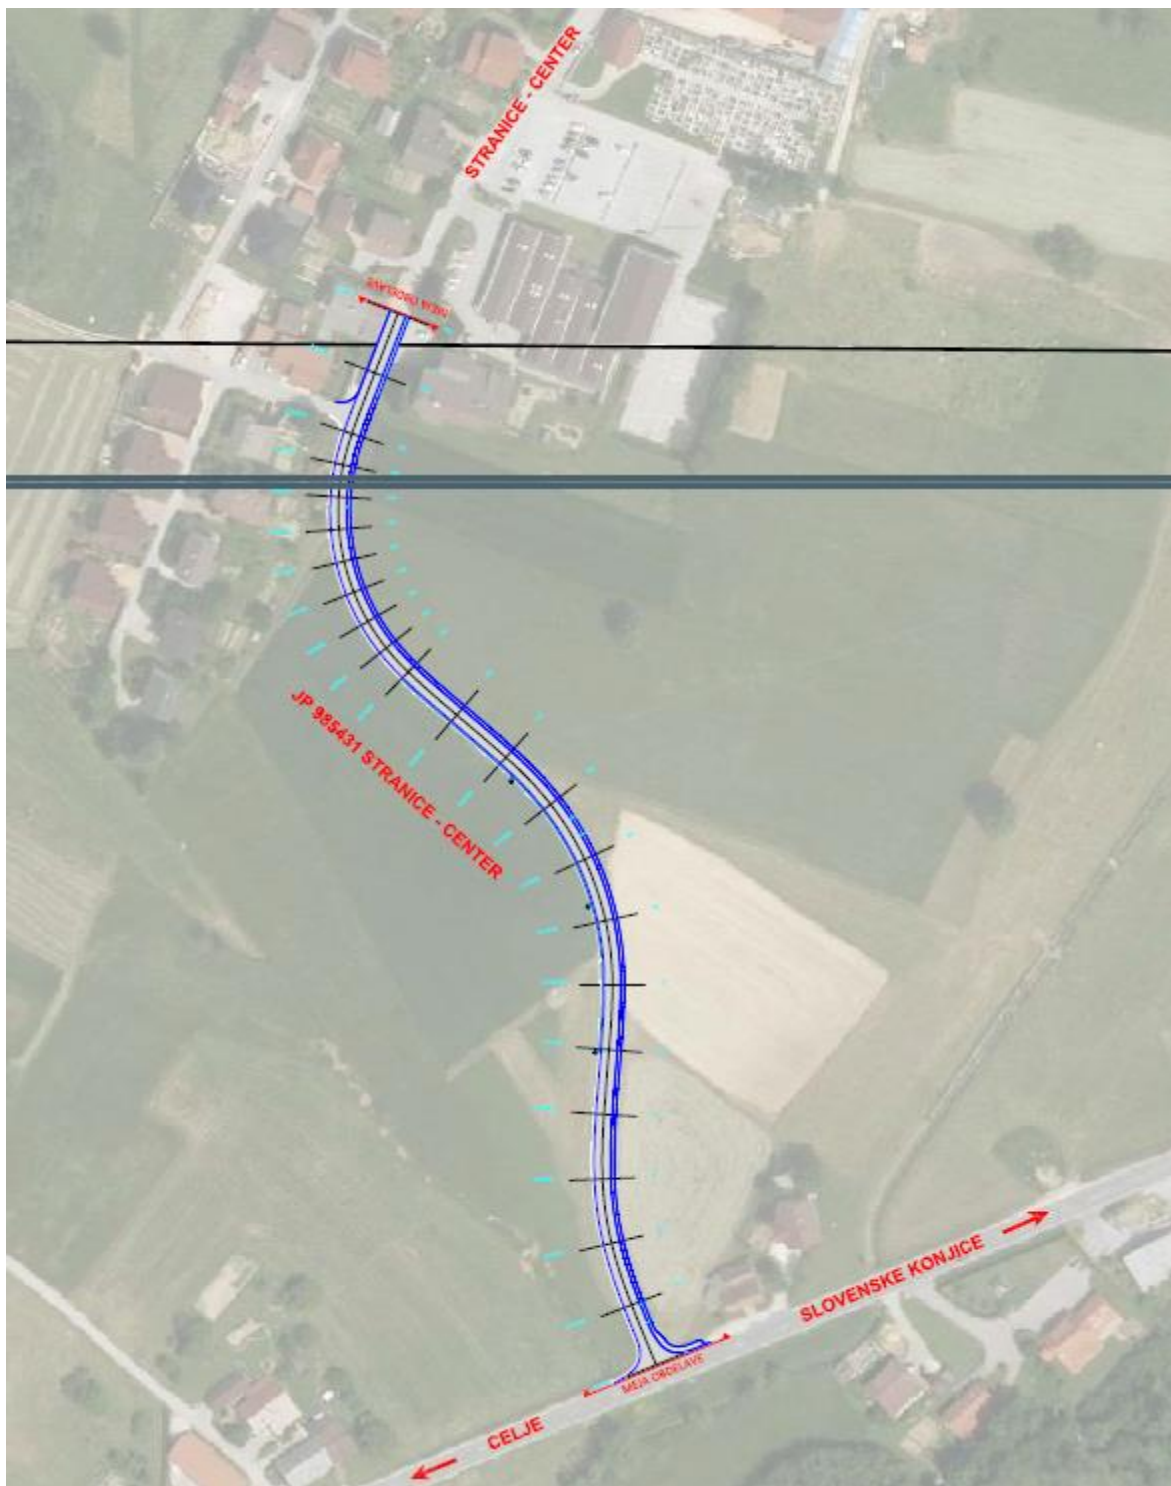

Slika - Pregledna situacija

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) smo že spomladi 2017 izbrali najugodnejšega izvajalca GP LUGARIČEK, d. o. o., Celje. Izbrani ponudnik bi moral z deli pričeti v 10 dneh po podpisu pogodbe tj. 5. 7. 2017 s strani obeh pogodbenih strank in dela zaključiti najkasneje v roku 90 koledarskih dni od podpisa pogodbe, to je 3. 10. 2017. Dne 11. 7. 2017 je bila opravljena uvedba izvajalca v delo, na kateri so bile dogovorjene obveznosti izvajalca in roki, v katerih bi moral opraviti določena dejanja.

Ker se izvajalec dogovorjenih rokov iz Gradbene pogodbe, uvedbe v delo in večkratnih ustnih dogovorih o pričetku del ni držal, smo mu s strani Občine Zreče posredovali obvestilo o odstopu od pogodbe in dne 5. 10. 2017 podali zahtevo za unovčenje kavcijskega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, za celoten znesek zavarovanja, to je 16.855,83 EUR, kar je bilo pozitivno rešeno.

Zaradi vsega navedenega smo konec oktobra 2017 pričeli nov postopek izbire izvajalca na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in izbrali izvajalca **GMI, d. o. o., Slov. Konjice**, kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Vrednost pogodbenih del znaša skupaj:

vrednost del brez DDV: 148.852,78 EUR

DDV (22 %): 32.747,61 EUR

vrednost del z DDV: **181.600,39 EUR**

Izbrani ponudnik bo z deli pričel 15. 2. 2018 (lahko tudi prej, v kolikor bodo to dopuščale vremenske razmere) ter jih zaključil najkasneje do 31. 5. 2018.

Strokovni (gradbeni) nadzor bo izvajalo podjetje GINS d.o.o., Matjaž Mernik.

Vire za financiranje zagotavlja proračun Občine Zreče v višini 105.921,39€ in ostali del Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 75.679,00€ kot povratna sredstva.
